# AI订舱录单项目

## 2.27 月会

- **一句话总结：产品1期即将发布，项目进展整体可控**
- **主要策略：**

| 阶段 | 横向：向更多业务场景拓展 | 纵向：向流程上下游拓展 |
| --- | --- | --- |
| step1 -331 | 少数航线/客户，仅主单录单 | 人工发起任务和提交数据 + AI完成任务 |
| step2 - 930 | 更多航线/客户，主单+分单录单 | 部分AI识别客户意图自动发起任务并完成 |
| step3 | 全场景覆盖 | 更多AI识别客户意图自动发起任务并完成 + 任务管理 |

- **所需支持：**

### （1）项目目标进度

| 序号 | 项目目标 | 指标定义 | 初始值 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 操作主分单比例 | 使用AI订舱录单数/总单数 | 0% | |
| 2 | AI 订舱录单准确率 | AI 正确操作单数/使用AI订舱录单数 | 0% | |
| 3 | AI 客户意图识别比例 | 通过AI意图识别生成的任务数/总任务数 | 0% | |
| 4 | AI 意图识别准确率 | 意图识别正确的任务数/通过意图识别生成的任务数 | 0% | |

### （2）项目关键进展

- 产品1期即将上线：2.11 完成 UAT，2.27 产品发布（原计划2.12），初期目标跑通产品链路，实现3条航线2个BSA客户AI订舱录单90%准确率
  - 两种任务类型：订舱，录单
  - 两个关键步骤：
    - 数据解析：原始文件 =》解析为标准数据
    - 系统转录：标准数据 =》转录到航司系统

**（3）项目重点风险（需要William or D重点关注）**

⚠️ 暂无

**（4）节奏**

| 时间<br>（季度or月度都可以） | 运营动作里程碑 |
| --- | --- |
| FY26 331 | • 3条航线主单订舱及录单AI化 |
| FY27 930 | • 8条航线主/分单订舱录单AI化；<br>• 9条航线客户订舱录单资料AI识别收集，客群覆盖率达 30%； |
| FY27 330 | • AI agent 任务管理；<br>• 9条航线主/分单订舱录单AI化；<br>• 9条航线客户订舱录单资料AI识别收集，客群覆盖率达 60% |

# 1.27 KO

**一、业务背景：【订舱】和【录单】环节是航空货代业务中，将货物运输信息传递至航司及其他相关方的重要环节，是所有货代和航司都会涉及的基础操作。**

**痛点1：数据处理繁琐**

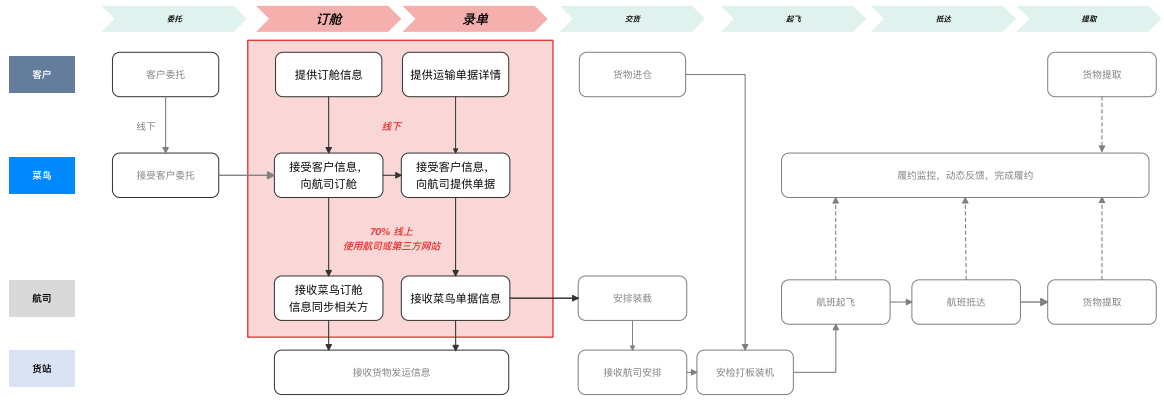
需将不同客户从不同渠道提供的线下信息按照不同航司要求加工处理，数据处理复杂度高

**痛点2：航司系统操作复杂**

航司操作复杂，对数据格式要求严格，人工手动录入准确率和效率均较低

**痛点3：信息孤岛**

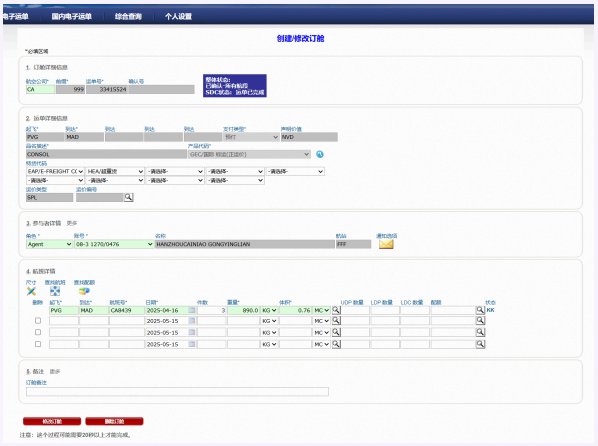
线下表格与系统数据隔离，需花费大量人工精力做数据整理和一致性校验



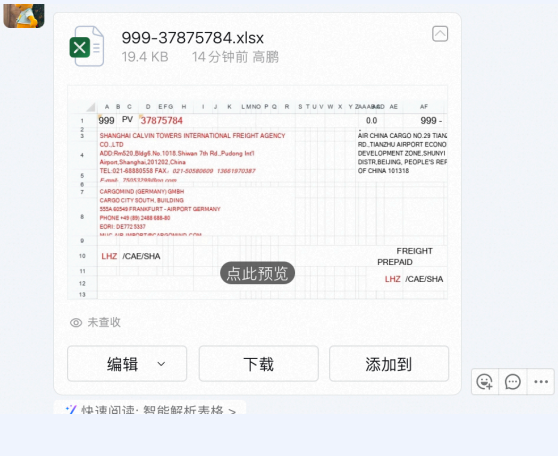

## 客户向菜鸟订舱



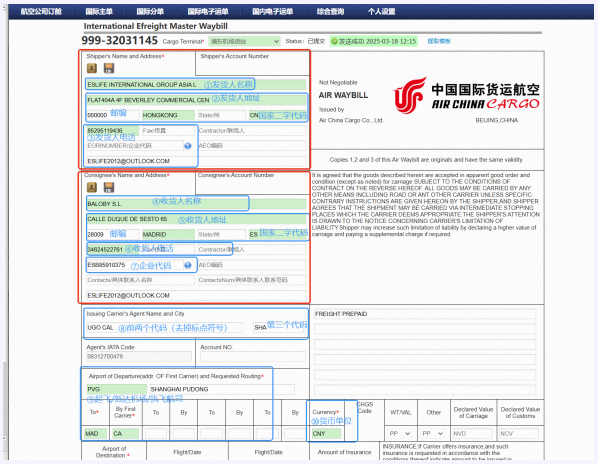

## 菜鸟在航司系统CCSP订舱




## 客户向菜鸟提供主/分单信息




## 菜鸟在航司系统CCSP录单



## 二、项目目标、节奏 & 路径：

| SOP & 目标 | AI 提效方向 | 项目节奏 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FY26 S2 | FY27 S1 | FY27 S2 |
| 业务目标 | | • 人效提升（AI化率） 12%<br>• 释放工作量相当于 0.5 HC | • 人效提升（AI化率） 30%<br>• 释放工作量相当于 1.5 HC | • 人效提升（AI化率） 50%<br>• 释放工作量相当于 2.5 HC |
| 能力目标 | | • AI订舱录单准确率 >95% | • AI意图识别准确率 >95%<br>• AI订舱录单准确率 >95% | • AI意图识别准确率 >95%<br>• AI订舱录单准确率 >95% |
| 覆盖场景 | | • 3条航线主单订舱及录单AI化 | • 8条航线主分单订舱录单AI化；<br>• 9条航线客户订舱录单资料AI识别收集，客群覆盖率达 30%； | • AI agent 任务管理；<br>• 9条航线主分单订舱录单AI化；<br>• 9条航线客户订舱录单资料AI识别收集，客群覆盖率达 60% |
| 1.收订舱资料 | 客户协同，意图识别 | / | 30% | 60% |
| **2.订舱** | **实操替代，GUI** | **40%** | **80%** | **95%** |
| 3.收取录单资料 | 客户协同，意图识别 | / | 30% | 60% |
| **4.录单（主分单）** | **实操替代，GUI** | **30%** | **70%** | **95%** |
| **5.跟单表记录** | **任务&信息管理** | / | / | **50%** |

【项目KO】AI订舱&录单项目需求说明

【PRD】航空订舱&录单 数字员工产品方案

milestone
