本周待办：

- [ ] 1、下周技术内部会议，确定交付逻辑； @郭春兴(江水)(江水) @姚祺(文祺)(姚祺) @易小芳(夏易)(夏易) 2026年07月29日
- [ ] 2、分单功能文件解析，需要产品输出产品方案，增加配置态，配置模版，增加解析高清度。 @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年07月30日
- [ ] 3、业务侧确认主单list页面、主单详情页 字段信息是否齐全。
  AI订舱录单-分单录入能力建设PRD @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月30日
- [ ] 4、业务协助算法 check 文件预标注的正确性，并给出分单核心字段，确保解析不能出错的部分；时间待确定。。。

上周关注：

7月成功率降低，原因是7月初 百炼模型不稳定导致 终止任务数量增多，从而使成功率下降；

二、业务确认分单PRD

业务无问题/疑问，按照 梅青、豆糕 的PRD内容，进入研发阶段；


AI订舱录单-分单录入能力建设PRD

【PRD】航空分单录入产品方案评审

三、研发工作量评估

部门	开发人员	预计投入人日
CTS航空技术	江水、马天宇	
Agent Z技术	夏易	15
核心算法部	姚祺、蹊洲、月间	80
AI研发效能	恺程、	待定

四、项目节奏确认

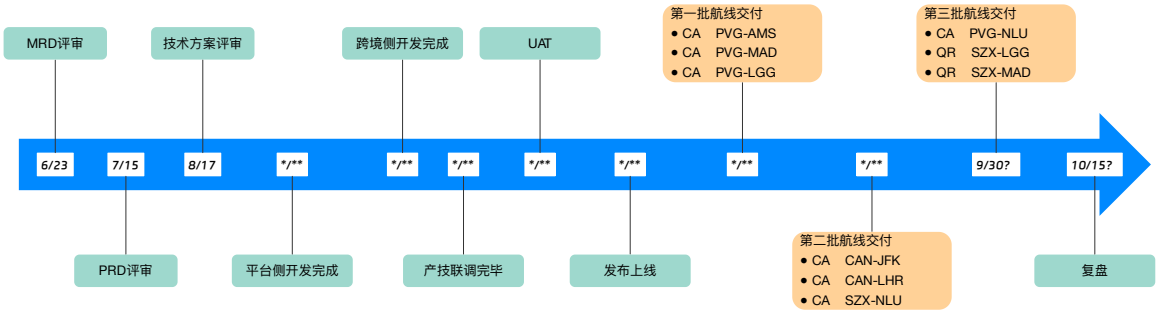

关键事项	时间	负责人
✅MRD评审通过时间	6/23	@盛云迪(林浅)(林浅)
✅PRD评审时间	计划： 7/15 实际： 7/22	@蒋蕾(豆糕)(豆糕) @王亚田(梅青)(梅青)
▶技术方案评审时间	8/17	@周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @郭春兴(江水)(江水)
▶跨境侧开发完成	待定	
▶平台侧开发完成	待定	
▶产技联调完成	待定	
▶提测	待定	@周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @郭春兴(江水)(江水)
▶UAT	待定	@蒋蕾(豆糕)(豆糕) @王亚田(梅青)(梅青)
▶产品功能上线时间	待定	@周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @郭春兴(江水)(江水)

第一批欧线 航线交付 • CA PVG-AMS • CA PVG-MAD • CA PVG-LGG • CA CAN-LHR • QR SZX-LGG • QR SZX-MAD	待定	
第二批美线 航线交付 • CA CAN-JFK • CA SZX-NLU • CA PVG-NLU	待定	
复盘	10/15 ?	@盛云迪(林浅)(林浅)

五、线上问题review

上线问题tracking
