本周待办：


上周关注：

- [x] 1、下周技术内部会议，确定交付逻辑； @郭春兴(江水)(江水) @姚祺(文祺)(姚祺) @易小芳(夏易)(夏易) 2026年07月29日
- [x] 2、分单功能文件解析，需要产品输出产品方案，增加配置态，配置模版，增加解析高清度。 @蒋蕾(豆糕)(豆糕) 2026年07月30日 --待算法确定技术方案后，和PD沟通确定产品方案
- [x] 3、业务侧确认主单list页面、主单详情页 字段信息是否齐全。
  AI订舱录单-分单录入能力建设PRD @盛云迪(林浅)(林浅) 2026年07月30日
- [x] 4、业务协助算法 check 文件预标注的正确性，并给出分单核心字段，确保解析不能出错的部分；--下周三（8/5）算法和业务确认

二、分单需求研发工作量评估确认

部门	开发人员	预计投入人日
CTS航空技术	江水、马天宇	85
Agent Z技术	夏易	15
核心算法部	姚祺、蹊洲、月间	80
AI研发效能	恺程	--

累计共：180人/日

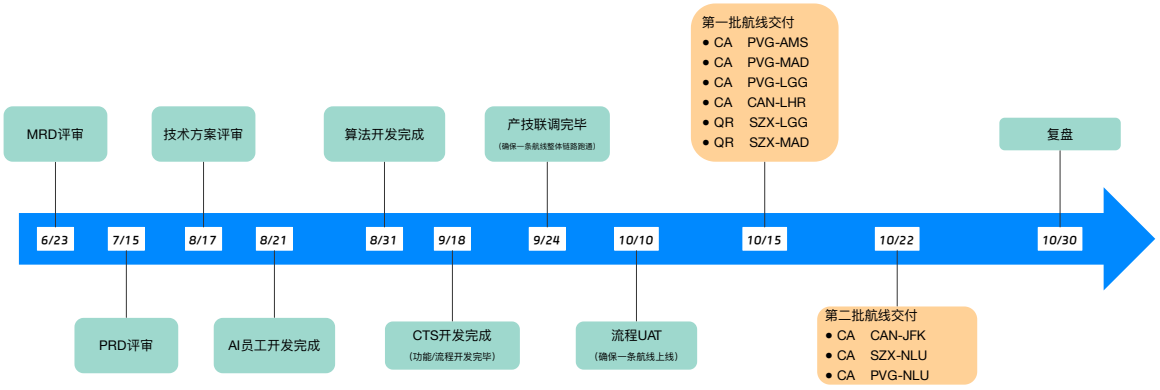


关键事项	时间	负责人
✅MRD评审通过时间	6/23	@盛云迪(林浅)(林浅)
✅PRD评审时间	计划：7/15 实际：7/22	@蒋蕾(豆糕)(豆糕) @王亚田(梅青)(梅青)
▶️技术方案评审时间	8/17	@周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @郭春兴(江水)(江水)
▶️ AI员工侧开发完成	~~8/21~~➡️9/10	新增发消息的部分，待重新确认时间
▶️ 算法开发完成	~~8/31~~➡️9/10	月间正在修复主单KIE，时间需要delay一周
▶️AgentZ流程画布更新	9/16	
▶️CTS侧开发完成	9/10	
▶️产技联调	9/10开始链条	
▶️产技联调完成	~~9/24~~➡️9/16	
▶️UAT 第一批欧线 航线交付 • CA PVG-AMS • CA PVG-MAD	~~10/10~~➡️**9/24**	@盛云迪(林浅)(林浅) @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)

• CA PVG-LGG • CA CAN-LHR • QR SZX-LGG • QR SZX-MAD		
▶第二批美线 航线交付 • CA CAN-JFK • CA SZX-NLU • CA PVG-NLU	~~10/22~~➡10/15	@盛云迪(林浅)(林浅) @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)
▶复盘	10/30	@盛云迪(林浅)(林浅)

三、汉莎线的产技计划

领域	事项	负责人	工作量（人日）	完成时间
业务	业务规则梳理	@盛云迪(林浅)(林浅)	--	✅已经交付
CTS航空	航线配置	@郭春兴(江水)(江水)	4	10/28
算法	文档解析（主单/分单）	@姚祺(文祺)(姚祺)	10	11/06
	航司网站GUI录入	@姚祺(文祺)(姚祺)	10	11/06
AgentZ & 业务CTS	Working Units搭建+测试	@王亚田(梅青)(梅青) @盛云迪(林浅)(林浅) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)	3	11/11配置完成；
	UAT		--	11/12

累计工作量：27，放在分单功能后开发；

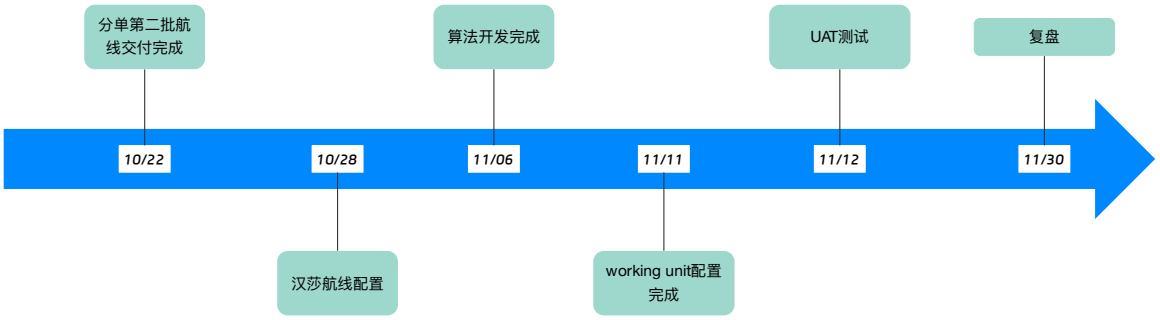

四、线上问题review

1、订舱Demo优化建议

AI订舱demo优化建议

2、线上问题

上线问题tracking
