
一、上周ACTION同步

- [x] 1、时间阶段：技术方案评审时间、联调时间、UAT时间等； @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun)
- [x] 2、确定 主单任务出现问题的处理方，主单重复度的问题； @张国中(少若)(少若)

二、风险进展同步

【open】人员调整：原项目PM兼 技术PM @张国中(少若)(少若)，被抽掉去集团战役项目。后续将由 @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun) 项目PM&技术PM。少若的工作将由 @王甜(甜王)(王甜) 接手，目前已完成交接。

三、项目进展同步

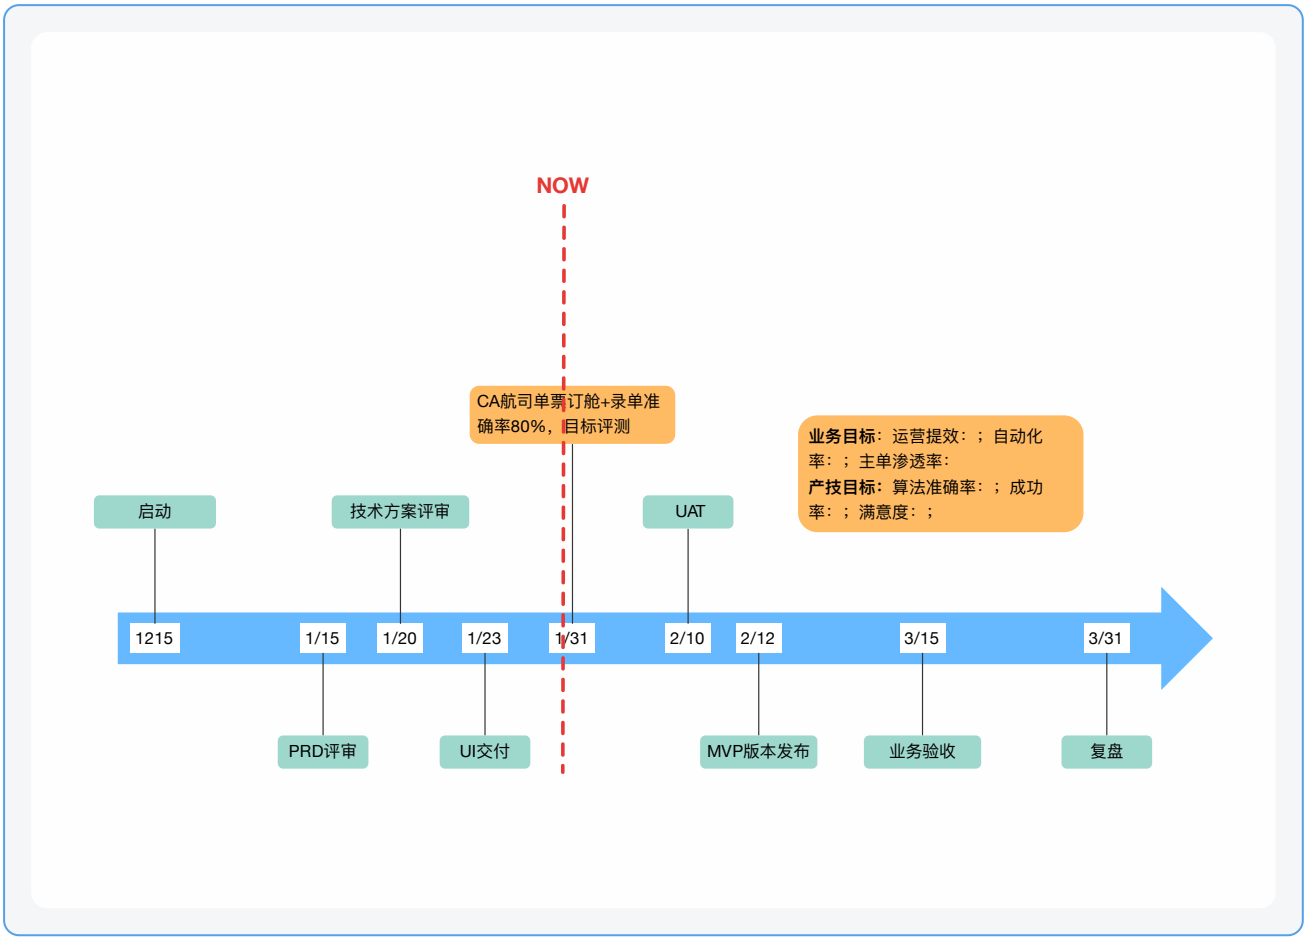

会议内容

1. 时效问题，目前任务执行时间太长要10分钟，需要进行优化； @黄俊(欧仑)(欧仑-oulun)
2. 比对校验时的弹窗大小调整，目前弹窗小，不好校验里面的数据。需要调整交互，支持弹窗全屏，左边的云端沙箱加一个放大按钮 @王甜(甜王)

3. 在云端沙箱的任务提交后，需要把**最后的页面截图保留下来**，以便于复核以及区分任务明细，最好是直接把图片渲染在页面上，一进来就可以看见 @王甜(甜王)
4. 「提交」按钮交互调整，放到弹框下（提交操作需要在弹框的按钮上，不能在沙箱中操作） @王甜(甜王)(王甜)
5. 任务栏名称命名&展示字段调整； @蒋蕾(豆糕)(蒋蕾) @王甜(甜王)(王甜)
6. 任务列表增加创建任务人的筛选，支持多选； @蒋蕾(豆糕)(蒋蕾)

