本周待办：

- [ ] 本周线上问题处理



业务侧问题反馈

类型	问题	详情	需求分类	优先级	提出日期	提出人	附件	解决人	预计修复时间	目前状态
需求	remark内容识别兼容	特殊版面：NOTIFY放到了别的地方，系统识别还是按照栏位来，识别了尺寸 https://agent.cainiao-inc.com/task?digitalId=914&source=workflow&processId=348047628344553473	基础能力	P0	8月18日	上官灵通	157-884 16193 MAWB.pdf	@陈希茹(月间)	9月3日	方案评估中
问题	GUI任务提交节点暂存失败	1. https://agent.cainiao-inc.com/task?digitalId=914&source=workflow&processId=347993597806006273 2. https://agent.cainiao-inc.com/task?digitalId=914&source=workflow&processId=347993630903259137 3. https://agent.cainiao-inc.com/task?digitalId=914&source=workflow&processId=347998263762587649	基础能力	P0	8月18日	陈凯文		@姚祺(文祺)	8月27日	提出
问题	品名录入不准确	SZX-LGG/MAD品名多录了hs https://agent.cainiao-inc.com/task?digitalId=914&source=workflow&processId=347998263762587649	基础能力	P0	8月18日	上官灵通		@郭春兴(江水)	8月21日	提出
需求	文档解析失败	兼容doc格式的主单资料和版面（针对can-lhr）	体验优化	P1	8月12日	黄卓玲		@姚祺(文祺)	9月3日	方案评估中
问题	异常信息提醒		基础能力	P0	7月23日	邵斐 陈颖		@郭春兴(江水) @蒋蕾(豆糕)	8月21日	提出
问题	终止问题显示	人工节点超时自动终止变成已取消（超时时间：60 分钟，节点ID：人工处理_zittm6s2zri98ssx）	体验优化	P0	8月6日	林浅	截屏 2026-08-06 15.15.24.png	@蒋蕾(豆糕)	8月27日	提出
问题	特货代码逻辑错误	ECC删除后，代理代码也被误删掉了	基础能力	P1	7月23日	邵斐 陈颖		@郭春兴(江水)	7月23日	提出

- [ ] 分单方案中的消息通知渠道待确定产品方案
- [ ] 人工节点超时由“已终止”修改为“已取消”
- [ ] 人工节点异常通知信息配置

上周关注：


- [x] 线上问题处理：文档解析的版面覆盖问题已解决
- [x] 文档解析新版本发布以及指标离线验证
- [x] 分单技术方案评审与时间节点对焦

二、分单需求研发工作量评估确认

部门	开发人员	预计投入人日
CTS航空技术	江水、马天宇	85
Agent Z技术	夏易	15
核心算法部	姚祺、蹊洲、月间	80

AI研发效能	恺程	--

累计共：180人/日

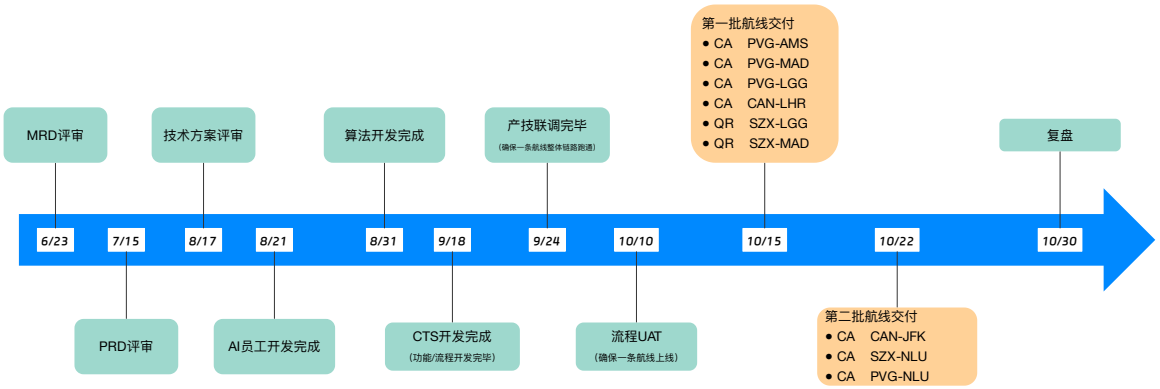

关键事项	时间	负责人
✅MRD评审通过时间	6/23	@盛云迪(林浅)(林浅)
✅PRD评审时间	计划：7/15 实际：7/22	@蒋蕾(豆糕)(豆糕) @王亚田(梅青)(梅青)
✅技术方案评审时间	8/17	@周光兵(光彪)(光彪(Evan Zhou)) @郭春兴(江水)(江水)
▶ AI员工侧开发完成	~~8/21~~ 9/10	新增发消息的部分，待重新确认时间
▶ 算法开发完成	~~8/31~~ 9/10	月间正在修复主单KIE，时间需要delay一周
▶CTS侧开发完成	9/10	@郭春兴(江水)
▶AgentZ流程画布更新+测试	9/15	@蒋蕾(豆糕) @姚祺(文祺)
▶产技联调	9/10开始联调	
▶产技联调完成	~~9/24~~ 9/18	


UAT验收 第一批欧线 航线交付 • CA PVG-AMS • CA PVG-MAD • CA PVG-LGG • CA CAN-LHR • QR SZX-LGG • QR SZX-MAD	~~10/10~~ ➡️ **~~9/24~~**	@盛云迪(林浅)(林浅) @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)
第二批美线 航线交付 • CA CAN-JFK • CA SZX-NLU • CA PVG-NLU	~~10/22~~ ➡️ 10/15	@盛云迪(林浅)(林浅) @王亚田(梅青)(梅青) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)
复盘	10/30	@盛云迪(林浅)(林浅)

三、汉莎线的产技计划

领域	事项	负责人	工作量（人日）	完成时间
业务	业务规则梳理	@盛云迪(林浅)(林浅)	--	✅已经交付
CTS航空	航线配置	@郭春兴(江水)(江水)	4	10/28
算法	文档解析（主单/分单）	@姚祺(文祺)(姚祺)	10	11/06
	航司网站GUI录入	@姚祺(文祺)(姚祺)	10	11/06
AgentZ & 业务CTS	Working Units搭建+测试	@王亚田(梅青)(梅青) @盛云迪(林浅)(林浅) @蒋蕾(豆糕)(豆糕)	3	11/11配置完成；

	UAT		--	11/12

累计工作量：27，放在分单功能后开发；

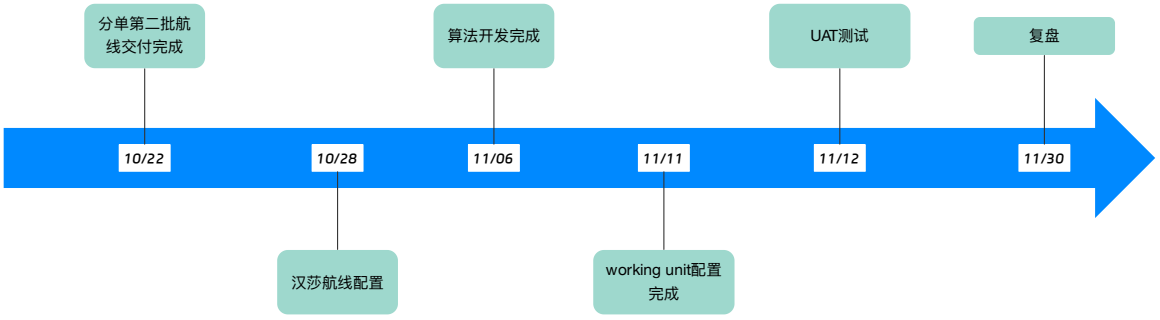

四、线上问题review

1、订舱Demo优化建议

AI订舱demo优化建议

2、线上问题

上线问题tracking
